PROPOSTA · NOVEMBRO 2026

velora. Growth & Beyond × talentfour performance+resultado

Desenvolvimento de sistema de aquisição.

Uma proposta para ampliar a abertura de contas estratégicas na Talent Four, conectando inteligência de mercado, marketing e abordagem comercial.



PARTE 01 / DE 04

01

A Velora

SISTEMAS DE AQUISIÇÃO PARA VENDAS B2B COMPLEXAS

01 A Velora

02 A Talent Four

03 A proposta
DIAGNÓSTICO · PREPARAÇÃO · OPERAÇÃO

04 Investimento e projeções

A VELORA

Como as empresas compram

Em vendas B2B complexas, a decisão começa antes da conversa comercial e envolve muitas pessoas.

~80%

Das compras B2B analisadas, o fornecedor escolhido já era o preferido antes do primeiro contato com vendas.

6SENSE · BUYER EXPERIENCE RESEARCH, 2025

5–16

Profissionais podem participar de decisões de compra B2B mais complexas.

GARTNER · SALES SURVEY, 2025

49%

Dos líderes de vendas relatam diferenças importantes entre marketing e comercial na definição de um lead qualificado.

GARTNER · CSO SURVEY, 2025

Por isso, marketing, vendas e dados precisam agir juntos. Antes do primeiro contato e durante toda a negociação.

A VELORA

Sistema de aquisição B2B

Em vendas complexas, crescer com previsibilidade exige marketing, vendas e tecnologia operando como um único sistema.

01

Marketing

Gera relevância nas contas certas, antes de existir uma demanda formal.

02

Vendas

Conduz a conversa com cada decisor até a proposta e a homologação.

03

Tecnologia e IA

Dá escala à pesquisa, contexto à abordagem e medição a cada etapa.

RESULTADO

Um fluxo previsível de oportunidades, com o custo de cada etapa conhecido.

A VELORA

O sistema em cinco etapas

Marketing, vendas e tecnologia atuam juntos em cada etapa, e cada ciclo parte do que o anterior ensinou.

	01 Inteligência	02 Acesso	03 Demanda	04 Conversão	05 Medição
Marketing ATRAIR E PREPARAR	ICP e mensagens por segmento	Conteúdo para cada papel do comitê	Mídia e página de conversão	Materiais de apoio à proposta	Custo e retorno por canal
Vendas ABORDAR E CONVERTER	Contas priorizadas com o time	Abordagem direta aos decisores	Conversas qualificadas	Proposta e homologação	Pipeline revisado toda semana
Tecnologia e IA DAR ESCALA E MEDIR	Radar de sinais de mercado	Enriquecimento de contatos	Personalização com IA	CRM e automação de cadências	Painel do funil

A VELORA

Experiência em vendas B2B complexas

Resultados de projetos conduzidos pelos sócios da Velora.

KPMG

B2B · ABM · CRM

Estratégia de GTM e geração de demanda para produtos B2B enterprise. Todas as metas anuais de MQL, SQL e reuniões foram superadas.

+31%
KPMG Watch

+37%
KPMG Krast

+19%
KPMG Upright

+370%
KPMG NPL

Sabemi

DEMAND GEN · REVOPS · CRM

Novo app para ampliar as vendas no canal digital. Em 9 meses, os resultados superaram as metas.

9x
crescimento da receita no período

+4x
taxa de conversão

-64%
custo de aquisição (CAC)

Bernardo Costa
Estratégia e dados · 20 anos de carreira, professor de MBA

Everton Henke
Growth, CRM e analytics · 10+ anos, professor da ESPM

Leonardo Wartha
Vendas · 20+ anos em times comerciais B2B

Princípios de trabalho

O que orienta a parceria com a Talent.

01 **O relacionamento é um ponto de partida**

A experiência e as conexões existentes ganham alcance com novas formas de identificar oportunidades.

02 **Marketing e vendas na mesma direção**

Contas prioritárias, mensagens e indicadores definidos em conjunto.

03 **Primeiro aprender, depois ampliar**

Ciclos curtos para testar abordagens, entender os resultados e ajustar prioridades.

04 **O conhecimento fica com a Talent**

Bases, processos, materiais e aprendizados passam a fazer parte da operação.

PARTE 02 / DE 04

02

A Talent Four

talentfour
performance+resultado

1992
INÍCIO DA OPERAÇÃO

~350
CONSULTORES ALOCADOS

5 + 1
GERENTES DE CONTA E HUNTER

01 A Velora

02 A Talent Four

03 A proposta
DIAGNÓSTICO · PREPARAÇÃO · OPERAÇÃO

04 Investimento e projeções

A TALENT FOUR

O que ouvimos da Talent

Uma operação madura, que quer abrir novas contas com previsibilidade.

ONDE A TALENT ESTÁ

- Crescimento construído por relacionamento e indicação desde 1992, com ~350 consultores alocados.
- Concentração de receita a medir no diagnóstico.
- Novas contas chegam sobretudo quando alguém conhecido muda de empresa, num ritmo que a Talent não controla.
- Um hunter recém-contratado, que precisa de contas, contexto e mensagem para render rápido.

ONDE A TALENT QUER CHEGAR

- Ampliar o número de contas protagonistas em bancos, seguros e saúde.
- Ser homologada antes da demanda aparecer, não depois.
- Ofertas de entrada que abram portas em grandes contas, como squads de QA e perfis escassos.
- Previsibilidade: saber quanto custa abrir uma conta e onde investir.

O CUSTO DE NÃO MUDAR

Cada conta grande que homologa um concorrente antes da Talent fica fechada por anos. Com 6 posições, uma conta representa cerca de R$ 1,4 mi por ano de faturamento.

A TALENT FOUR

Como a Talent cresceu

O relacionamento abre portas, e a capacidade de entrega transforma acesso em contratos.

01

Relacionamento

Profissionais que já conhecem a Talent levam essa referência a novas empresas.

02

Indicação

A área de TI apresenta a Talent ao processo de compras.

03

Homologação

Cadastro, documentação e definição de condições por perfil.

04

Concorrência

A empresa convida fornecedores homologados a atender às demandas.

05

Alocação

A capacidade de encontrar o perfil adequado com agilidade faz diferença.

É um caminho valioso, construído ao longo dos anos. A oportunidade é complementá-lo com novas fontes de acesso a contas estratégicas.

A TALENT FOUR

Oportunidades de crescimento

Três caminhos para ampliar a presença da Talent em grandes contas.

01 **Acesso**

Chegar aos profissionais de TI e compras que participam da escolha de novos fornecedores.

02 **Aproximação**

Construir conversas relevantes e entender o caminho até a homologação.

03 **Presença**

Ampliar o conhecimento sobre a Talent e seu portfólio antes de uma demanda formal.

A TALENT FOUR

O relacionamento trouxe a Talent até aqui.

Nossa proposta é ampliar esse alcance com novas formas de abrir contas.



PARTE 03 / DE 04

03

A proposta

SEIS MESES EM TRÊS FASES · DIAGNÓSTICO · PREPARAÇÃO · OPERAÇÃO

01 A Velora

02 A Talent Four

03 A proposta
DIAGNÓSTICO · PREPARAÇÃO · OPERAÇÃO

04 Investimento e projeções

Visão do projeto

Seis meses para construir, colocar em prática e avaliar um novo modelo de aquisição.

MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MESES 12 A 18

FASE 1 · MÊS 1

Diagnóstico

Em 3 a 4 semanas, entender a carteira, a atuação comercial, o marketing e as oportunidades de mercado.

FASE 2 · MÊS 2

Preparação e implementação

Definir a estratégia de entrada no mercado, classificar cerca de 500 contas e preparar as frentes de atuação.

FASE 3 · MESES 3 A 6

Operação e ajustes

Executar as frentes, gerar conversas com decisores, acompanhar homologações e evoluir a abordagem a partir dos dados.

DESENVOLVIMENTO DAS CONTAS

EXPECTATIVA

Grandes contas costumam exigir maturação. O primeiro semestre cria as condições para aprender, abrir oportunidades e construir referências de custo; o desenvolvimento das contas pode se estender por 12 a 18 meses. As projeções de retorno da parte 04 seguem essa rampa.

velora.
Growth & Beyond

FASE 1 / DE 3

01

Diagnóstico

MÊS 1 · 3 A 4 SEMANAS

Entender a operação e identificar onde atuar primeiro.



MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6

FASE 1 · DIAGNÓSTICO

O que o diagnóstico cobre

Quatro frentes de análise em 3 a 4 semanas, reunidas em um único plano.

01

Carteira

Analisar concentração, perfil das contas e oportunidades de expansão.

02

Comercial

Mapear o fluxo comercial, o CRM e os indicadores para dar ao hunter e aos gerentes mais contas, mais contexto e menos trabalho manual.

03

Marketing

Avaliar site, stack de martech, conteúdo e presença nos canais em que os clientes pesquisam fornecedores.

04

Mercado

Definir o perfil de cliente ideal e dimensionar as contas com maior potencial.

ENTREGÁVEL

Plano priorizado: melhorias de curto prazo, ações para as semanas seguintes e iniciativas estruturantes.

FASE 1 · DIAGNÓSTICO

Respostas que o diagnóstico trará

Ao final do mês 1, a Talent terá clareza sobre cinco perguntas.

	PERGUNTA	O QUE A TALENT RECEBE
01	**Onde está o potencial da carteira?**	Curva ABC de receita e margem, nível de concentração e contas com espaço para expansão.
02	**Quais empresas priorizar fora da carteira?**	Perfil de cliente ideal validado e universo de contas dimensionado.
03	**Quem decide e como chegar até essas pessoas?**	Mapa do comitê de compra por tipo de conta: demanda, homologação e influência.
04	**O que trava hoje, do contato à alocação?**	Leitura do processo comercial, do CRM, do marketing e dos indicadores atuais.
05	**Onde investir primeiro?**	Prioridades, metas de referência e responsáveis para os meses seguintes.

FASE 1 · DIAGNÓSTICO

Onde proteger receita e expandir na carteira atual

Antes de abrir novas contas, entender onde a receita está concentrada e onde há espaço para crescer.

Proteger receita

01 **Concentração de receita**
Medir receita, margem e consultores por cliente para ver onde a carteira está concentrada.

02 **Contas perdidas e em risco**
Revisar motivos de saída e sinais de alerta, cruzando tempo de relacionamento e serviços contratados.

Expandir

03 **Expansão na base**
Mapear serviços já homologados e ainda pouco vendidos, como testes e automação.

04 **Perfil para novas contas**
Comparar setor, porte da TI, maturidade e modelo de contratação nas contas com melhor resultado.

ENTREGÁVEL

Mapa da carteira · contas a proteger, espaço para expansão e critérios para o perfil de cliente ideal.

FASE 1 · DIAGNÓSTICO

Análise: timing do processo comercial

Medir quanto tempo cada etapa leva e onde as oportunidades param.

	ETAPA A INVESTIGAR	EVIDÊNCIA A LEVANTAR	TEMPO POR ETAPA	
01	**Origem e qualificação**	Como a demanda chega, quem qualifica e o que entra no CRM como oportunidade.		? dias
02	**Homologação**	Onde cadastro e aprovação em compras ficam parados.		? dias
03	**Rate card e concorrência**	Condições, prazos de resposta e motivos de perda nas propostas.		? dias
04	**Apresentação de perfis**	Tempo entre o pedido e os perfis apresentados, com a equipe de seleção.		? dias
05	**Primeira alocação**	Avanço após a homologação até o início do profissional ou squad.		? dias

FASE 1 · DIAGNÓSTICO

Do diagnóstico para o setup

Na semana 4, o plano é validado com a liderança e vira o ponto de partida da preparação.

O DIAGNÓSTICO ENTREGA	VALIDAÇÃO · SEMANA 4	O SETUP COMEÇA COM
ICP validado e contas dimensionadas	→	Classificação das ~500 contas em Tier 1, 2 e 3
Mapa do comitê de compra	→	Mensagens e ofertas de entrada por papel
Leitura do processo e do CRM	→	Etapas, critérios e prazos de passagem
Diagnóstico de marketing e do site	→	Briefing da página de conversão e do conteúdo
Prioridades e metas de referência	→	Plano dos quatro meses de operação

FASE 2 / DE 3

02

Preparação e implementação

MÊS 2

Definir a estratégia de entrada no mercado, classificar cerca de 500 contas e preparar as frentes de atuação.

MÊS 1 | **MÊS 2** | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6



FASE 2 · PREPARAÇÃO

Desenhando o go-to-market

Definimos juntos quais empresas priorizar, com quem conversar e como gerar interesse.

01

Onde concentrar esforços?

PERFIL DE EMPRESA (ICP)

Porte da operação de TI e uso de terceiros; setores como bancos, seguros, saúde, farma, varejo e energia; região e modelo de contratação; lista de contas desejadas pela Talent.

02

Quem participa da decisão?

PESSOAS ENVOLVIDAS

Demanda	CIOs, CTOs e lideranças de desenvolvimento, dados e qualidade.
Homologação	Compras e suprimentos.
Influência	PMOs, líderes de squad e contatos com histórico de relacionamento.

03

Como iniciar a conversa?

MENSAGENS E OFERTAS

Mensagens por setor e perfil, com evidências de experiência e capacidade de atendimento. A liderança de produto e comercial valida as ofertas de entrada.

Produção de cases, análises, white papers, calculadora e diagnósticos.

FASE 2 · PREPARAÇÃO

Formatação da oferta

Duas ou três ofertas de entrada que abram portas em grandes contas e criem caminho para expansão.

01 · 2 A 3 OFERTAS

Desenho das ofertas

Definir problema atendido, escopo, entregáveis e preço de referência. Explicitar o valor em números quando houver base para estimar.

02 · ENTRADA E EXPANSÃO

Exemplos para validação

QA	Squad de testes com escopo definido.
Automação	Automação de testes em um recorte do projeto.
Alocação	Perfil escasso para uma demanda identificada.

03 · NOVA CONTA E BASE ATUAL

Caminho de expansão

Em novas contas, a primeira entrega abre espaço para discutir o próximo escopo. Na carteira, apresentar serviços que o cliente ainda não contratou, considerando o que já está homologado.

FASE 2 · PREPARAÇÃO

Três frentes de aquisição

ABM, geração de demanda e prospecção trabalham sobre a mesma base: critérios, CRM e indicadores combinados entre os times.

01

ABM e radar de sinais

Identificar o contexto e o melhor momento para abordar contas prioritárias.

02

Geração de demanda

Ampliar a presença da Talent e facilitar a chegada de novas oportunidades.

03

Prospecção de decisores

Mapear pessoas relevantes e iniciar conversas com abordagens adequadas a cada conta.


RESULTADO

Novas oportunidades: conversa qualificada, homologação e primeira alocação.

FASE 2 · PREPARAÇÃO

Radar Velora: mapeamento do mercado da Talent Four

Sinais de mercado ajudam a identificar quando vale iniciar uma conversa.

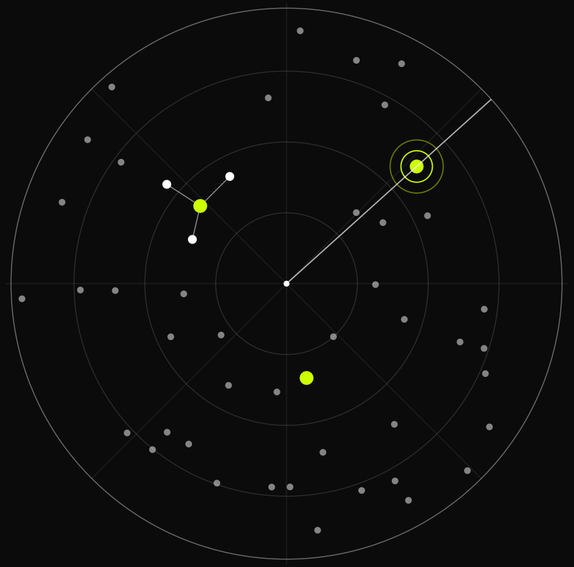

VELORA RADAR

Monitoramento de informações públicas e fontes de dados, com apoio de IA, para acompanhar as contas Tier 1 e Tier 2. A proposta é reunir indícios de mudança, oportunidade ou necessidade e dar contexto à abordagem do hunter e dos gerentes.

SINAL	O QUE PODE INDICAR
Aumento de vagas de TI	Expansão de equipe ou necessidade de capacidade adicional.
Chegada de um novo CIO ou CTO	Momento favorável para apresentar novas alternativas.
Contato conhecido em outra empresa	Possibilidade de reabrir uma relação de confiança.
Novo projeto, aquisição ou expansão	Potencial demanda por profissionais ou squads.
Mudança na política de trabalho presencial	Alterações na disponibilidade e na composição das equipes.

SAÍDA ESPERADA — Um alerta com contexto, pessoas relevantes e sugestão de próximo passo.

FASE 2 · PREPARAÇÃO

Classificação de contas

A grande entrega da preparação: contas priorizadas e decisores mapeados.

~500

Contas priorizadas com o time da Talent, de acordo com seu potencial e a abordagem necessária.

~2.500

Profissionais mapeados dentro das empresas, com e-mail e LinkedIn (analisar a possibilidade de WhatsApp).

Tier 1 · ~50 CONTAS ESTRATÉGICAS

Abordagem individual, com apoio da diretoria e dos gerentes de conta.

Tier 2 · ~150 CONTAS PRIORITÁRIAS

Outbound automatizado · nível 1.

Tier 3 · ~300 DESENVOLVIMENTO DE MERCADO

Outbound automatizado · nível 2.

FASE 2 · PREPARAÇÃO

Prospecção de decisores

Abordagens relevantes começam com uma boa leitura da conta.

01

Mapear

Identificar quem participa da demanda, da influência e da homologação em cada empresa.

02

Personalizar

Contatos por e-mail, LinkedIn e, nas contas prioritárias, ligação, de acordo com o perfil de cada decisor.

03

Contextualizar

Sinais de mercado e conteúdos relevantes para escolher o momento e a mensagem.

04

Conectar ao comercial

Conversas qualificadas seguem para o hunter ou gerente de conta, com contexto e próximos passos.

Infraestrutura: domínios dedicados, configuração técnica de envios e acompanhamento da entregabilidade.

FASE 2 · PREPARAÇÃO

Aquisição digital: dois caminhos

Estar presente quando existe uma necessidade e ser lembrada antes dela surgir.

Captar demanda

Impactar quem já está em jornada de compra.

- Google Ads para buscas por alocação de TI, squads e serviços de QA.
- Presença nas pesquisas pela marca Talent Four.
- Página de conversão com ofertas e caminho claro para contato.




Gerar demanda

Impactar quem está percebendo o problema.

- Conteúdo segmentado no LinkedIn para as contas Tier 1 e Tier 2.
- Ferramenta de comparação: alocar profissionais ou contratar via CLT.
- Guias, estudos e materiais úteis sobre contratação e terceirização de TI.

Meta LinkedIn



FASE 2 · PREPARAÇÃO

Captar demanda


Inserir a Talent Four no contexto de empresas que já estão em jornada de compra.


FASE 2 · PREPARAÇÃO

Gerar demanda

Conteúdos de alta densidade, na linguagem e na profundidade dos decisores do mercado de TI.








FASE 2 · PREPARAÇÃO

Indicadores do funil

Critérios compartilhados para acompanhar cada oportunidade sem perder contexto.

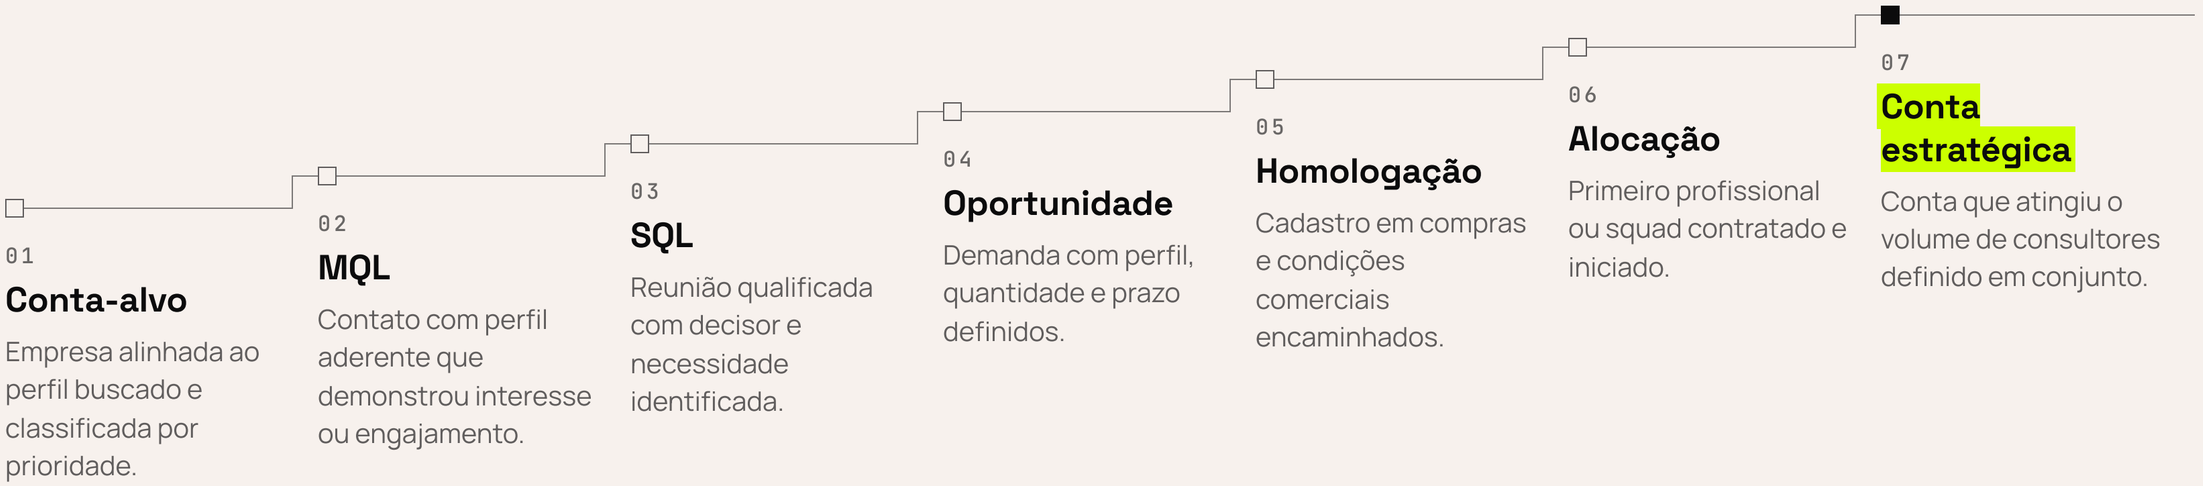

01
Conta-alvo
Empresa alinhada ao perfil buscado e classificada por prioridade.

02
MQL
Contato com perfil aderente que demonstrou interesse ou engajamento.

03
SQL
Reunião qualificada com decisor e necessidade identificada.

04
Oportunidade
Demanda com perfil, quantidade e prazo definidos.

05
Homologação
Cadastro em compras e condições comerciais encaminhados.

06
Alocação
Primeiro profissional ou squad contratado e iniciado.

07
Conta estratégica
Conta que atingiu o volume de consultores definido em conjunto.

PRAZOS DE REFERÊNCIA · A COMBINAR COM A TALENT

Contato com MQL em até 24 horas; passagem de SQL com resumo da conta; acompanhamento em até 48 horas; atualização semanal do CRM.

O QUE VAMOS MEDIR

Volume e conversão por etapa, tempo de avanço e origem das oportunidades.

velora.
Growth & Beyond

FASE 3 / DE 3

03

Operação e ajustes

MESES 3 A 6

Colocar as frentes em prática, aprender e ajustar a partir dos dados.

MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6



FASE 3 · OPERAÇÃO

Página de conversão

Uma página que mostre com clareza por que conversar com a Talent.

OPORTUNIDADES DE MELHORIA IDENTIFICADAS

- Dar mais destaque a experiências, resultados e depoimentos disponíveis.
- Apresentar serviços e soluções com mensagens mais específicas.
- Organizar conteúdos de apoio às decisões de contratação.
- Revisar páginas e informações ainda em desenvolvimento.

O QUE PROPOMOS PARA A NOVA PÁGINA

- Provas de experiência, como clientes autorizados e indicadores verificáveis.
- Ofertas de entrada orientadas às necessidades de cada empresa.
- Comparativo entre alocação e contratação direta.
- Convite claro para conversar, com acompanhamento das conversões.

FASE 3 · OPERAÇÃO

Equipe de aquisição digital

Uma equipe de apoio para transformar a estratégia em campanhas e materiais.

01 **Design**

Peças, página de conversão e materiais de apoio, como guias e comparativos.

02 **Mídia**

Google para buscas por marca e alocação; LinkedIn para as contas Tier 1 e Tier 2.

03 **Redação**

Textos para anúncios, cadências, páginas e materiais por público.

04 **Criativos**

Adaptação das mensagens para peças estáticas, carrosséis e vídeos.


INVESTIMENTO EM MÍDIA

Cerca de R$ 10 mil por mês nos quatro meses de operação, concentrado em Google e LinkedIn e pago diretamente pela Talent às plataformas e ajustado em conjunto na fase de preparação.

FASE 3 · OPERAÇÃO

Cronograma e timing de vendas

Trilha comercial de 90 dias: a Talent conduz reuniões, negociação e expansão; a Velora orienta, revisa e mede o avanço.

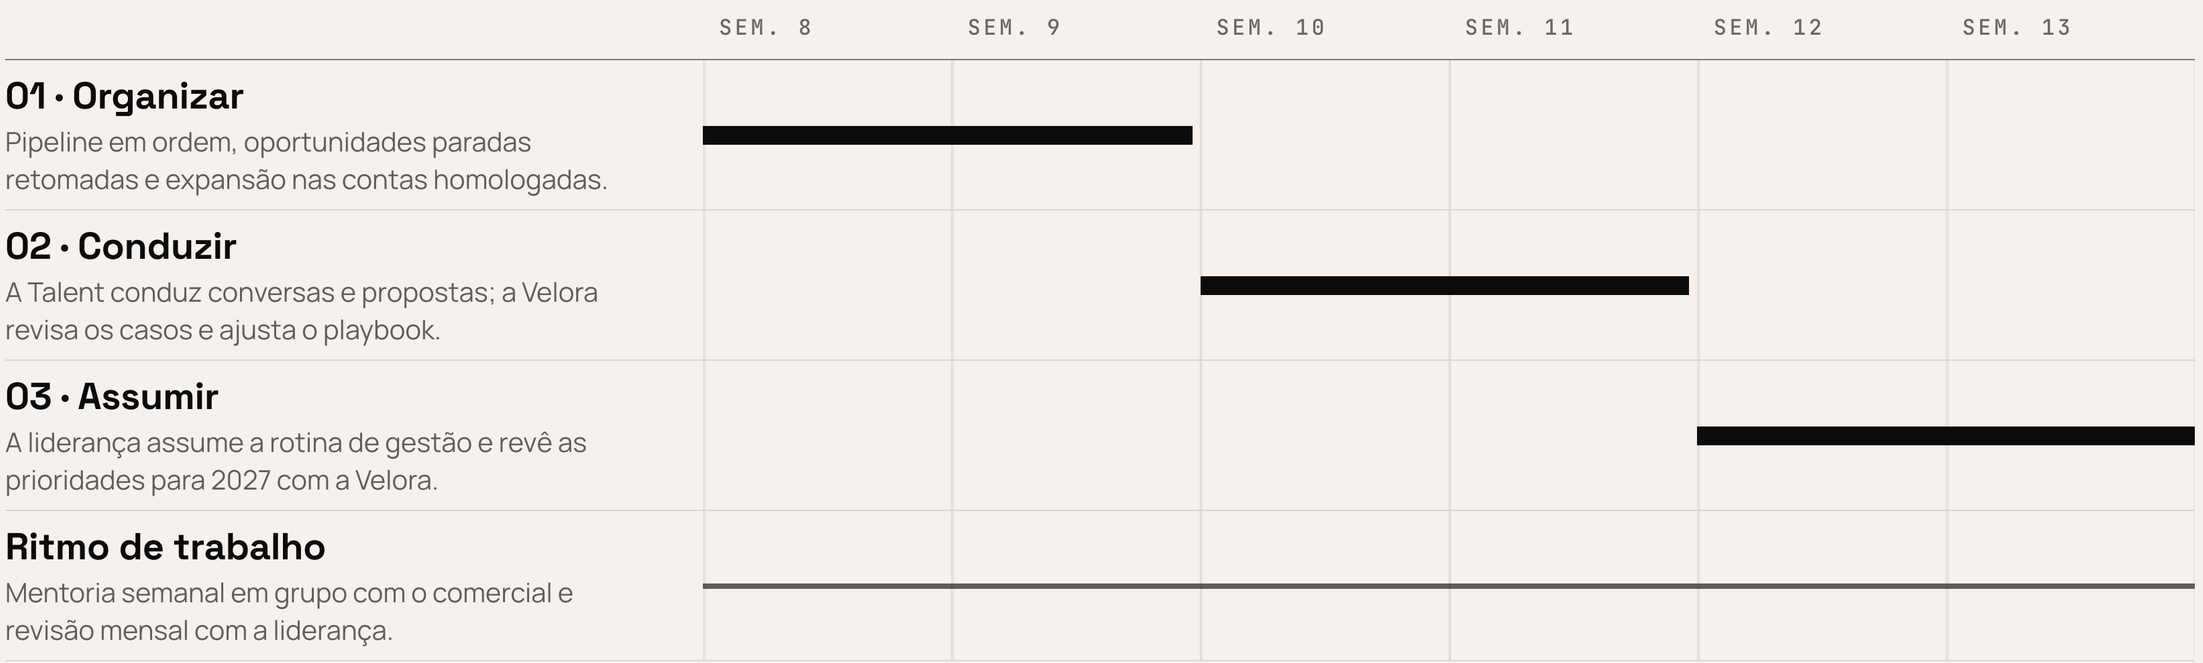

FASE 3 · OPERAÇÃO

Projeção de reuniões

Um cenário inicial para orientar metas e ajustar com dados reais.

FRENTE	BASE DE REFERÊNCIA	HIPÓTESE INICIAL	REUNIÕES · MESES 3 A 6
Prospecção	2.500 contatos trabalhados	~1,5% de conversão em reunião	**~40**
ABM Tier 1	~50 contas	~10% a 20% de conversão em reunião	**~10 a 15**
Aquisição digital	Google, página e conteúdo	A medir	**Meta de ~10**
Total de referência	—	—	**~60 a 65**

POSSÍVEIS DESDOBRAMENTOS DO CENÁRIO

15–20
oportunidades ATÉ O MÊS 6

6–8
homologações iniciadas MESES 5 A 9

4
contas com a primeira alocação MESES 6 A 12

FASE 3 · OPERAÇÃO

Growth e ciclo de aprendizagem

A cada ciclo de duas a três semanas, os dados decidem o que manter, melhorar ou mudar.

A CADA CICLO

R

Review
Revisar

Analisar os resultados das frentes e os avanços das oportunidades.

H

Hypothesis
Formular hipóteses

Identificar o ajuste com maior potencial de impacto.

O

Operationalize
Colocar em prática

Executar as mudanças com responsáveis e prazos definidos.

I

Inspection
Avaliar

Verificar os efeitos e decidir o próximo ciclo.

EVOLUÇÃO ESPERADA NOS QUATRO MESES DE OPERAÇÃO

Mês 1
Primeiros dados de resposta e conversão.

Mês 2
Mensagens, canais e prioridades ajustados.

Mês 3
Primeiras referências de custo e desempenho por etapa.

Mês 4
Leitura consolidada dos resultados e próximos testes.

FASE 3 · OPERAÇÃO

Sinais de evolução

As reuniões avaliam lista e mensagem; o painel mostra se as oportunidades viram contas ativas e se a carteira se diversifica.

ESFORÇO

RESULTADO

01

Cobertura e qualificação

Contas trabalhadas por nível e conversão de contato em reunião.



02

Avanço no funil

Reuniões que viram oportunidades e tempo por etapa.



03

Compras e propostas

Homologações iniciadas e concluídas; propostas enviadas e ganhas.

04

Diversificação da carteira

Novas contas ativas, consultores nelas e peso dos maiores clientes no faturamento.

FASE 3 · OPERAÇÃO

O que fica com a Talent

Ao final, a Talent terá uma estrutura própria para continuar abrindo oportunidades.

O projeto reúne bases, rotinas, canais e indicadores para entender quais abordagens geram avanço comercial, quanto custa cada etapa e onde concentrar os próximos investimentos.

04 **Indicadores**
CRM e painel para acompanhar oportunidades, conversões e custos por etapa.

03 **Marketing e conteúdo**
Página, campanhas e materiais implementados e avaliados.

02 **Abordagens e roteiros**
Playbook, cadências e critérios para conduzir e expandir contas.

01 **Base e radar**
Contas classificadas e acompanhamento dos sinais mais relevantes.

Time e colaboração

Um trabalho conjunto, com responsabilidades claras entre Velora e Talent.

VELORA

Estratégia e acompanhamento

Bernardo Costa
Estratégia de crescimento e análise de dados.

Everton Henke
Metodologia e aquisição.

Leonardo Wartha
Apoio consultivo em processos comerciais e vendas.

VELORA

Especialistas de execução

Design
Peças, páginas e materiais.

Mídia
Campanhas em Google e LinkedIn.

Redação e criação
Textos e formatos para diferentes públicos.

TALENT FOUR

Negócio e relacionamento

Marcelo Magalhães
Patrocínio executivo e alinhamento das prioridades.

Liderança de produto e comercial
Ofertas de entrada, critérios de passagem e condução do pipeline.

Hunter e gerentes de conta
Relacionamento, reuniões, negociação e expansão.

Agência atual
Produção e desdobramentos de conteúdo, conforme alinhamento de escopo.

PARTE 04 / DE 04

04

Investimento e projeções

INVESTIMENTO · CUSTOS DE AQUISIÇÃO · RETORNO

01 A Velora

02 A Talent Four

03 A proposta
DIAGNÓSTICO · PREPARAÇÃO · OPERAÇÃO

04 Investimento e projeções

INVESTIMENTO

Investimento Talent Four

Seis meses de projeto: honorários da Velora, mídia e ferramentas.

VALORES VELORA

Mês 1 · Diagnóstico Imersão, análise das oportunidades e plano de ação.	**R$ 15 mil**
Mês 2 · Preparação e implementação Estratégia de entrada, contas e frentes.	**R$ 18 mil**
Meses 3 a 6 · Operação e ajustes R$ 21 mil por mês, com a equipe de especialistas.	**R$ 84 mil**
Subtotal	**R$ 117 mil**

MÍDIA E FERRAMENTAS

Verba de mídia ~R$ 10 mil/mês na operação, em Google e LinkedIn.	**R$ 40 mil**
Ferramentas e conectores de IA R$ 2 mil/mês desde o diagnóstico, para mapear o mercado.	**R$ 12 mil**
Subtotal	**R$ 52 mil**

INVESTIMENTO DO PERÍODO · 6 MESES

R$ 169 mil

INVESTIMENTO

Projeção de custos de aquisição

Investimento do período dividido pelo volume esperado em cada etapa.

INVESTIMENTO DO PERÍODO

R$ 169 mil

Honorários Velora	**R$ 117 mil**
Mídia · 4 × R$ 10 mil	**R$ 40 mil**
Ferramentas e IA · 6 × R$ 2 mil	**R$ 12 mil**

FORA DA SOMA: PARCELA POR RESULTADO DE R$ 15 MIL POR CONTRATO (R$ 60 MIL NO CENÁRIO DE 4 CONTAS).

ETAPA	VOLUME	CUSTO DE REFERÊNCIA	MESES DE MARGEM
Reunião	**~60 a 65**	**~R$ 2,8 mil**	—
Homologação	**6 a 8**	**~R$ 25 mil**	—
Contrato	**4**	**R$ 42 mil** R$ 57 MIL COM A PARCELA POR RESULTADO	—
Posição alocada	**24**	**R$ 7 mil** R$ 9,5 MIL COM A PARCELA	**~2,5** ~3,4 COM A PARCELA

Cada posição alocada se paga em cerca de 2,5 meses de margem bruta (3,4 meses com a parcela por resultado), num contrato que tende a durar anos. Custo de referência = investimento do período ÷ volume da etapa no cenário.

INVESTIMENTO

Retorno de investimento (6 meses)

Três cenários em cinco anos, com as contas entrando de forma gradual.

	CONSERVADOR	BASE	OTIMISTA
Contas novas	2	4	6
Posições médias por conta ANO 1 → ANO 2 → ANOS 3 A 5	1,5 → 2,5 → 3	2,5 → 5 → 6	3 → 6 → 7
Receita no ano 1	R$ 0,72 mi	R$ 2,40 mi	R$ 4,32 mi
Receita em 5 anos	R$ 5,2 mi	R$ 20,3 mi	R$ 35,9 mi
Margem bruta em 5 anos 14%, A SUBSTITUIR PELA MARGEM REAL	R$ 0,73 mi	R$ 2,84 mi	R$ 5,02 mi
Investimento total PERÍODO + PARCELA POR RESULTADO	R$ 199 mil	R$ 229 mil	R$ 259 mil
ROI com margem	~3,7x	~12x	~19x

As contas entram com 1 a 2 posições e chegam a 6 entre os meses 12 e 18; o ano 1 começa na primeira alocação. R$ 20 mil por posição, margem de 14% e churn de 8% ao ano a partir do ano 2, sem expansão além disso nem contas já em relacionamento. No conservador, a segunda parcela só ocorre no ano 3 (mantivemos R$ 199 mil). Margem e faturamento serão trocados pelos números da Talent no diagnóstico.

PROPOSTA · NOVEMBRO 2026

velora. Growth & Beyond × talentfour performance+resultado

Desenvolvimento de sistema de aquisição.

Uma proposta para ampliar a abertura de contas estratégicas na Talent Four, conectando inteligência de mercado, marketing e abordagem comercial.

